




CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

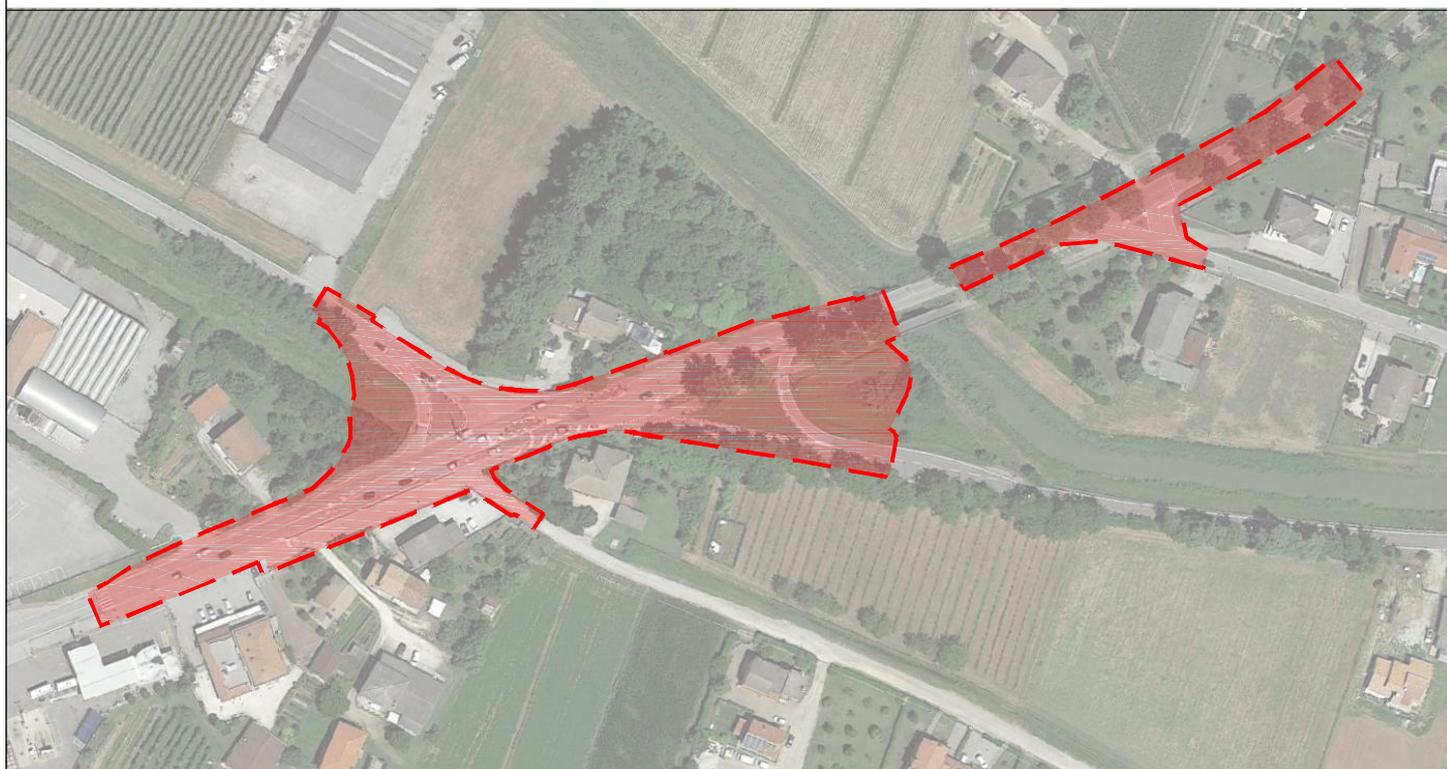

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <i>Ing. Nicola Torricella</i>		UBICAZIONE DELL' INTERVENTO COMUNE DI JESOLO (VE)	
SUPPORTO AL RUP <i>Ing. Francesca Nordio</i>		STRADA METROPOLITANA S.P. 42 - JESOLANA	
PROGETTAZIONE  Veritas S.p.a. Santa Croce, 489 30135 Venezia (VE) tel. 041.72.91.111 fax 041.72.92.643 e-mail: info@gruppoveritas.it		ELABORATO: 12.C	
RESP. CONDUZIONE E MANUTENZIONE RETI ACQUEDOTTI - Ing. Giuseppe Dalla Bona - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia N. iscrizione 4489			
REV.	DESCRIZIONE	DATA	TITOLO ELABORATO:
rev. 0	PRIMA EMISSIONE	15/11/2024	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE RETE ACQUEDOTTO: CRONOPROGRAMMA
			NOME FILE: s2005c6ie-0.pdf
			SCALA: -

CRONOPROGRAMMA POSA CONDOTTA IDRICA E COLLEGAMENTO ALLA RETE ESISTENTE

N.	FASE ATTUATIVA	DURATA IN SETTIMANE																							
		0,5	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	10,5	11	11,5	
1	Inseidiamento cantiere, rilievi, segnalazione sottoservizi, definizione del tracciato, segnaletica di cantiere	■	■																						
	TRATTO 1-4 (S.P. 42 Jesolana) DN 150																								
2-3	Demolizione del manto stradale, scavo			■	■	■	■																		
4-5	Formazione del letto di posa, posa tubazioni e accessori idraulici			■	■	■	■																		
6	Reinterri degli scavi con inerti			■	■	■	■																		
7	Ripristini stradali con binder			■	■	■	■																		
	TRATTO 5-6 (via S. Marco - via Posteselle) DN 250																								
2-3	Demolizione del manto stradale, scavo							■	■	■	■														
4-5	Formazione del letto di posa, posa tubazioni e accessori idraulici							■	■	■	■														
6	Reinterri degli scavi con inerti							■	■	■	■														
7	Ripristini stradali con binder							■	■	■	■														
	TRATTO 5-3 (via S. Marco - S.P. 42) DN 200																								
2-3	Demolizione del manto stradale, scavo											■	■												
4-5	Formazione del letto di posa, posa tubazioni e accessori idraulici											■	■												
6	Reinterri degli scavi con inerti											■	■												
7	Ripristini stradali con binder											■	■												
	TRATTO 2-7 (via Taglio del Re) DN 80																								
2-3	Demolizione del manto stradale, scavo													■											
4-5	Formazione del letto di posa, posa tubazioni e accessori idraulici													■											
6	Reinterri degli scavi con inerti													■											
7	Ripristini stradali con binder													■											
8	Prova in pressione e lavaggi condotta														■	■	■	■							
9	Collegamenti alla rete esistente																		■	■	■	■			
10	Realizzazione allacciamenti																					■	■	■	

E
S
E
C
U
Z
I
O
N
E

L
A
V
O
R
I
