




# CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Area infrastrutture edilizia e viabilità

Ca' Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia (VE)  
Via Forte Marghera, 191 - 30173 Mestre (VE)

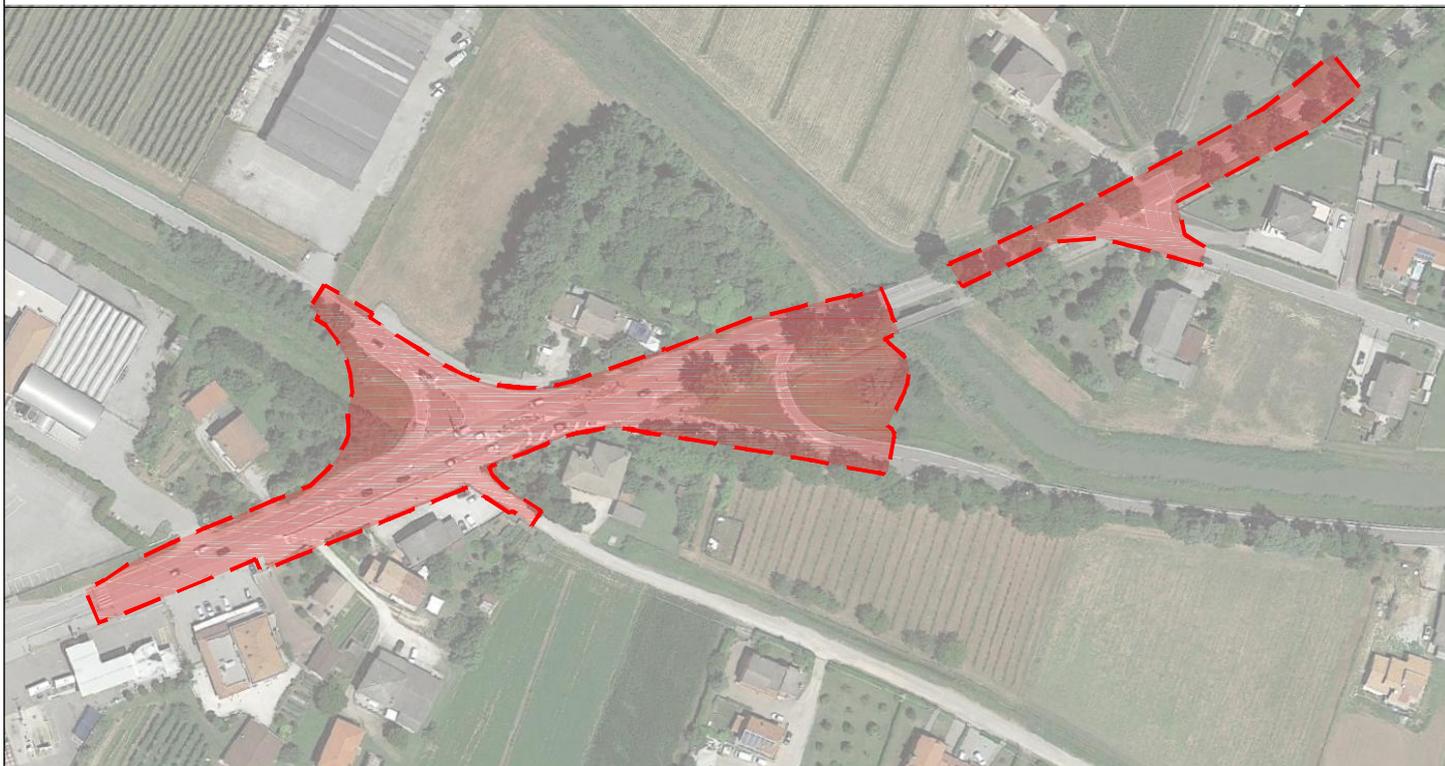

## PROGETTO ESECUTIVO

### REALIZZAZIONE DELLE ROTATORIE D'INTERSEZIONE TRA SP 42 - JESOLANA, VIA SAN MARCO, VIA POSTESELE E ADEGUAMENTO DELL'INNESTO TRA SP 42 - JESOLANA E VIA TRINCHET NEL COMUNE DI JESOLO (VE)

<b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b> <i>Ing. Nicola Torricella</i>		<b>UBICAZIONE DELL' INTERVENTO</b> COMUNE DI JESOLO (VE)	
<b>SUPPORTO AL RUP</b> <i>Ing. Francesca Nordio</i>		STRADA METROPOLITANA S.P. 42 - JESOLANA	
<b>PROGETTAZIONE</b>  <b>SIMMOS PIANI &amp; PROGETTI</b> srl 30173 Venezia-Mestre Via Martiri della Libertà 242/B Tel.: 041-5362593 Fax: 041-2667922 Email: info@simmos.it Web: http://www.simmos.it Email PEC: simmos1@pec.it		firmato digitalmente Ing. Antonio Colella Ing. Gianluca Notarigo Ing. Alberto Colella 	
		<b>ELABORATO:</b> 	
<b>REV.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>DATA</b>	<b>TITOLO ELABORATO:</b>
rev. 0	PRIMA EMISSIONE	15/11/2024	<b>QUADRO ECONOMICO</b>
			<b>NOME FILE:</b> s2005c6i4-0.pdf
			<b>SCALA:</b> -

**QUADRO ECONOMICO**

<b>N.R.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Parziale</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
	LM	<b>LAVORI A MISURA</b>			€ 147.831,52		11,63%
	LM - L1	<b>Lotto n.01 - Rotonde</b>			(€ 109.977,11)		8,65%
	LM - L1 - 03	<b>Indennizzi di smaltimento o recupero</b>			(€ 109.977,11)		8,65%
	LM - L2	<b>Lotto n.02 - Via Trinchet</b>			(€ 37.854,41)		2,98%
	LM - L2 - 03	<b>Indennizzi di smaltimento o recupero</b>			(€ 37.854,41)		2,98%
	LC	<b>LAVORI A CORPO</b>			€ 1.123.084,17		88,37%
	LC - L1	<b>Lotto n.01 - Rotonde</b>			(€ 887.749,38)		69,85%
	LC - L1 - 01	<b>Demolizioni e fresatura asfalti</b>			(€ 105.592,15)		8,31%
	LC - L1 - 02	<b>Scavi</b>			(€ 13.519,07)		1,06%
	LC - L1 - 04	<b>Rinterri e sottofondi</b>			(€ 154.325,77)		12,14%
	LC - L1 - 05	<b>Invaso e risagomatura</b>			(€ 24.563,17)		1,93%
	LC - L1 - 06	<b>Linea acque meteoriche</b>			(€ 102.434,94)		8,06%
	LC - L1 - 07	<b>Spostamento sottoservizi</b>			(€ 39.668,76)		3,12%
	LC - L1 - 08	<b>Illuminazione pubblica</b>			(€ 105.433,10)		8,30%
	LC - L1 - 09	<b>Asfalti e cordonate</b>			(€ 211.179,81)		16,62%
	LC - L1 - 10	<b>Marciapiedi e Recinzioni</b>			(€ 59.541,87)		4,68%
	LC - L1 - 11	<b>Sistemazioni a verde</b>			(€ 26.659,15)		2,10%
	LC - L1 - 12	<b>Segnaletica</b>			(€ 44.831,59)		3,53%
	LC - L2	<b>Lotto n.02 - Via Trinchet</b>			(€ 235.334,79)		18,52%
	LC - L2 - 01	<b>Demolizioni e fresatura asfalti</b>			(€ 25.771,98)		2,03%
	LC - L2 - 02	<b>Scavi</b>			(€ 4.952,68)		0,39%
	LC - L2 - 04	<b>Rinterri e sottofondi</b>			(€ 28.632,65)		2,25%
	LC - L2 - 06	<b>Linea acque meteoriche</b>			(€ 1.694,50)		0,13%
	LC - L2 - 08	<b>Illuminazione pubblica</b>			(€ 24.011,19)		1,89%
	LC - L2 - 09	<b>Asfalti e cordonate</b>			(€ 45.464,40)		3,58%
	LC - L2 - 10	<b>Marciapiedi e Recinzioni</b>			(€ 99.263,80)		7,81%
	LC - L2 - 11	<b>Sistemazioni a verde</b>			(€ 640,36)		0,05%
	LC - L2 - 12	<b>Segnaletica</b>			(€ 4.903,23)		0,39%
	ImpC	Sommano			<u>€ 1.270.915,69</u>	€ 1.270.915,69	
1	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)				€ 72.659,36	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 1.270.915,69	
3	IN	Importo netto dei lavori				€ 1.343.575,05	
4	B	Somme B					
5	B1	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze				€ 9.626,30	
6	B5	Imprevisti [7,5% di codice IN]				€ 100.768,13	
7	B3	Acquisizione aree (comprese spese di frazionamento, decreti ect.) [2.107,43mq x 20€]				€ 42.148,60	

**QUADRO ECONOMICO**

<b>N.R.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità</b>	<b>Prezzo</b>	<b>Parziale</b>	<b>Importo</b>	<b>%</b>
8	B4	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai vari livelli di progettazione a cura del progettista (oneri previdenziali compresi)				€ 11.960,00	
9	B5	Spese tecniche relative alla progettazione (compresi oneri previdenziali)				€ 50.000,00	
10	B6	Spese tecniche relative alla Direzione dei Lavori (compresi oneri previdenziali) [3% di codice IN]				€ 40.307,25	
11	B7	Spese per accertamenti e collaudi [2,5% di codice IN]				€ 33.589,38	
12	B8	I.V.A. su rilievi e spese tecniche [22% di codici B4+B5+B6]				€ 33.667,78	
13	B18	I.V.A su lavori [10% di codice IN]				€ 134.357,51	
14	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 456.424,95	
15	R	Riepilogo					
16	R1	Importo netto dei lavori				€ 1.343.575,05	
17	R2	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 456.424,95	
18	ICO	<b>Prezzo complessivo dell'opera</b>				€ 1.800.000,00	
